

Notat

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Anlæg & Miljø

Status i MUFJO demonstrationsområder	Ansvarlig	FBO
	Oprettet	20-12-2020
Projekt: 7846 Jordfordeling – Danmarks største puslespil	Side	1 af 4

Status for arbejdet i projektområde Tim Å 2020



Tilgange og processer anvendt i projektområdet

Som udgangspunkt har vi i hele processen søgt involvering og accept af lodsejere og øvrige partnere. Vi har i det omfang det har været muligt holdt fysiske møder og kommunikeret via mail og pressemeddelelser. De personer der har været en del af projektet, har lokal forankring, kommunal ansættelse, statslig ansættelse – Naturstyrelsen, landbrugsfaglig ansættelse – SAGRO medarbejdere og landbrugspolitisk tilknytning – Holstebro Egnens Landboforening og Herning Ikast Landboforening.

Tidslinje for aktiviteter:

2019

Aftale L&F/DN

Kaffebordsmøde med lodsejere langs Tim Å for orientering om MUFJO

Martin Merrild og Maria Reumert Gjerding besøger Tim Å

Sommerhusmøde med alle lodsejere vest for Holstebrovej

2020

Møde med Ringkøbing Skjern Kommune

Lodsejer møde – lodsejere øst og vest for Holstebrovej

Møde om lavbundsprojekt med lodsejere øst for Holstebrovej afholdt af Ringkøbing Skjern Kommune.

Møde i med lodsejer – styregruppe

Møde med Naturstyrelsen for drøftelse af lavbundsprojekt vest for Holstebrovej

Kaffebordsmøde med lodsejere og Naturstyrelsen

Virtuelt møde med styregruppe for lodsejere samt borger, natur og fritidsorganisationer

I februar 2019 fremlægger Landbrug & Fødevarer sammen med Danmarks Naturfredningsforening et fælles natur- og landbrugsudspil hvor Multifunktionel Jordfordeling – MUFJO bliver nævnt. Vi beskriver i Nyhedsbreve fra SAGRO foreningerne mulighederne i Multifunktionel Jordfordeling.

Kommunikationen herom medfører, at en gruppe lodsejere ved Tim Å henvender sig for at høre nærmere herom og hvilke muligheder det kan give for dem.

Der bliver afholdt Kaffebordsmøde med de pågældende lodsejere hvor mulighederne bliver forelagt.

Gruppen af lodsejere der deltager i det første møde, er alle større mælkeproducenter som har organogene jorde der grænser op til Tim Å. En enkelt af lodsejerne har gennem Arla fået lavet klimaregnskab. Klimaregnskabet viser at disse organogene jorde har meget negativ indflydelse på ejendommen klimaregnskab. Med dette som udgangspunkt, vil et MUFJO projekt kunne opfylde kravet om klimagas reduktion.

Herefter indkaldtes alle lodsejere (vest for Holstebrovej) til møde hvor kriterier og muligheder for MUFJO bliver gennemgået. Ved mødet kunne det konkluderes, at lodsejerne havde forskellige bevæggrunde der dog alle flugter med Nationale interesser med høj prioritet og Øvrige nationale interesser.

Med disse oplevelser afholdes møde med embedsværket i Ringkøbing Skjern Kommune for at afsøge muligheden for deres medvirken som projektejer. Der er positiv opbakning til det videre arbejde uden de dog giver tilsagn om at påtage sig rolle som projektejer.

Der afholdes møde med lodsejere (ca. 30) øst og vest for Holstebrovej, hvor MUFJO præsenteres. Alle lodsejere er positive overfor projektet. På kortmateriale indtegner de enkelte lodsejere deres arealer i området. To af de fremmødte lodsejere har erstatningsjord, som de tilbyder til projektet. På mødet vælges styregruppe til at repræsentere lodsejerne.

Ringkøbing Skjern Kommune afholder møde med lodsejere øst for Holstebrovej for præsentation af muligt lavbundsprojekt. Der træffes beslutning om igangsætning af forundersøgelse.

Der afholdes møde med styregruppe, repræsentanter fra Ringkøbing Skjern Kommune. På mødet bekræfter styregruppen det videre arbejde, hvor borgergrupper, skole, idrætsforening, DN og andre natur- og fritidsorganisationer.

Da Ringkøbing Skjern Kommune har tilkendegivet, at de ikke har ressourcer til lavbunds/klima projekt vest for Holstebrovej, afsøges muligheden for at Naturstyrelsen igangsætter forundersøgelse. Positivt tilsagn fra Naturstyrelsen.

Sammen med Naturstyrelsen afholdes Kaffebordsmøde for afklaring af lavbunds/klimaprojektets afgrænsning. Naturstyrelsen går i gang med forundersøgelse.

Der afholdes virtuelt møde med styregruppen nedsat af lodsejerne, repræsentanter for borger, natur og fritidsorganisationer. På mødet er der indlæg ved formanden for Collectiv Impact Søren Møller. På mødet kommer der mange indspil til områdets multifunktionalitet.

Der er indkaldt til møde januar 2021 med politikere og ledende medarbejdere i Ringkøbing Skjern kommune for at få dem til at påtage sig opgaven som projektejer.

Erfaringer gjort i 2020

De gode erfaringer:

- Møder med god tid og rum til at brainstorme og få alle ideer på banen så tidligt i processen som muligt. Med en tidlig inddragelse af lodsejerne har de været med til at promovere projektet.
- Det er en stor fordel, hvis projektansvarlig har lokalt kendskab til området samt lods ejere, for at kunne se mulighederne og skabe tillid.
- Lodsejere der overfor deres kollegaer har talt for projektet, virker godt.
- Få lokale ildsjæle med i processen
- Klima og biodiversitet har været "driveren" hvor konkrete tal fra lodsejere har været med til at skabe motivation.
- Inddragelse af erfaringer fra projekt omkring Kongeåen har været nyttigt.
- Fagligt og politisk samspil.
- Landbrugets positive indspil til "Klimadagsorden" har været med til at skabe forståelse.
- Der kan godt holdes møder uden fysisk fremmøde – god erfaring med virtuel møde.

Kunne være bedre:


- Ved opstart af projektet burde alle projektansvarlige havde været samlet for en grundig gennemgang af baggrund og indhold af MUFJO.
- Covid 19 har været den største udfordring, da mulighederne for at holde fysiske møder har været begrænset. Mange planlagte møder er blevet aflyst.

Hvor ser I de 3 største udfordringer i jeres arbejde under pilotordningen for multifunktionel jordfordeling.

1. Finansiering til at facilitere processen, compensation for værdiforringelse af jorden og de øvrige elementer der skal være en del af projektet.
2. Kommunal involvering – det er nyt og "farligt" land for dem.
3. Sikre samspil mellem forskellige ordninger – lavbundsprojekt/MUFJO

Hvordan kan der sikres fremdrift i MUFJO processen i jeres projektområde

Der skal udpeges lønnet projektansvarlig. Da kommune og Naturstyrelsen ikke helhjertet tager ansvar, skal opgaven kunne placeres hos rådgivningsselskab/landboorganisation der under ansvar overfor Ministeriet/Styrelsen udfører opgaven. Oplevelsen er, at med manglende involvering/tage ansvar, vil opgaven blive vanskelig og alt for bureaukratisk. Hvis opgaven placeres hos rådgivningsselskab/landboorganisation, vil der være god forbindelse til alle lodsejere. Kompetencer der ikke er i rådgivningsselskabet købes ekstern.

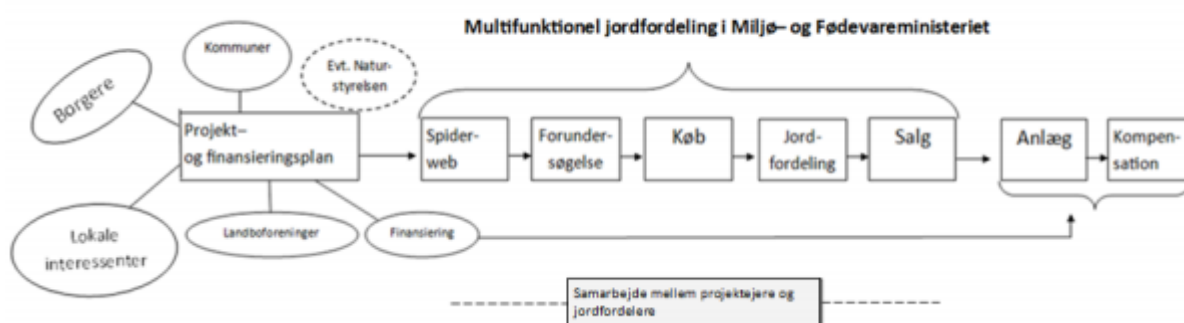

Bilag:

Fremgår af vedlagte bilag nr. 1 – 19. Desuden nedenstående links til artikler og anden information der er produceret.

- Video - <https://www.seges.tv/video/63427295/multifunktionel-jordfordeling-ved>
- Stor interesse for jordfordeling ved Tim Å - <https://www.sagro.dk/nyhedsarkiv/stor-interesse-for-jordfordeling-ved-tim-aa>
- Maskinbladet - <https://www.maskinbladet.dk/artikel/68526-stor-interesse-jordfordeling-tim>
- Landbrugsavisen - <https://landbrugsavisen.dk/landet-rundt/stor-interesse-jordfordeling-ved-tim-%C3%A5>
- Grobund 04 2020 - https://issuu.com/snekmose/docs/grobund_nr._4_-_2020_web
- Nyhedsbrev Holstebro Struer Landboforening, april 2020 - <https://www.holstebrostruerlandboforening.dk/media/3866/nyhedsbrev-april-2020.pdf>

20. december 2020

Stine Bundgaard
Karen V Thomasen
Niels Kr. Fruergaard
