

SEGES, d. 11. januar, 2016

Peter Raundal
SEGES Kvæg

STATUS – OG PERSPEKTIVERINGSMØDE, KLOVSUNDHED UDVIKLING

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri



LDP 2020




DAGSORDEN

- Velkomst, **5 min** (Peter)
- Kort status på 2275 – fagligt og leverancer, **10 min**
 - AP 1: Benchmarking værktøj (Pia) og rådgivningsværktøj (Peter)
 - AP 2: Fuldfoderoptimering (Niels)
 - AP 3: Benstilling (Pia)
- Kort status på time- og ressourceforbrug (Peter), **5 min**
- Drøftelse af status i forhold til mål (fælles), **10 min**
- Kort status på 2276 – fagligt og leverancer, **10 min**
 - AP 1: Systematisk halthedsscore (Pia)
 - AP 2: Videnformidling (Peter)
- Kort status på time- og ressourceforbrug, **5 min** (Peter)
- Drøftelse af status i forhold til mål (fælles), **10 min**
- Opfølgning på dokumentation, **5 min** (Anja)
- Perspektivering
 - Anvendelse af resultater efter projektafslutning, **25 min** (alle)
 - Fremtidige nye aktiviteter, **30 min** (alle)
- Eventuelt, **5 min**

AP 1: RÅDGIVNINGSKONCEPT

- Hvad har vi lovet (2015):
 - Leverance: Der er udviklet et foreløbigt rådgivningskoncept, der kan implementeres og afprøves i en række testbesætninger
- Hvad har vi lavet:
 - Workshop; Intern
Udvikling af foreløbigt rådgivningskoncept: Viden og erfaringer om generel rådgivningspraksis er indsamlet og opgavens afgrænsning er vurderet.

AP 1: RÅDGIVNINGSKONCEPT

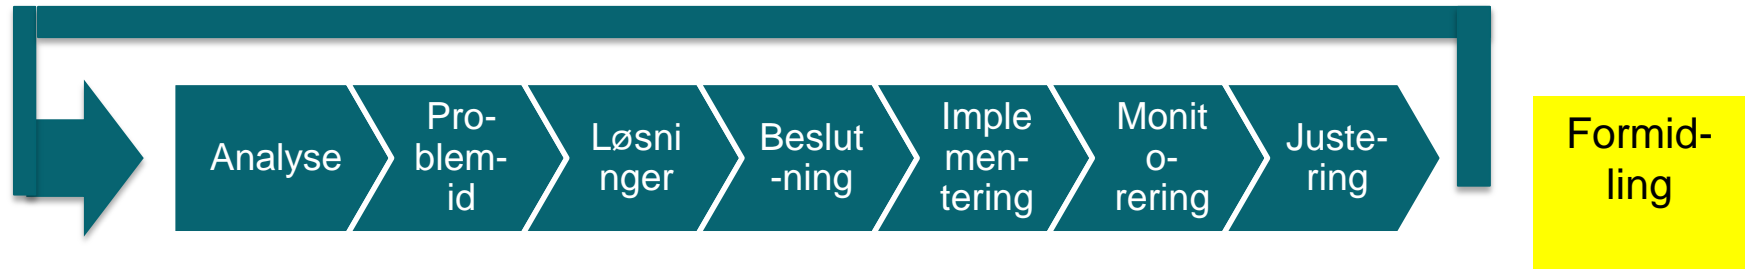

Kodød



Kalvedød



Kalvekursus



Klovsundhed



Kvieprodukt.



Ledelse




DMS



AP 1: RÅDGIVNINGSKONCEPT

- Hvad har vi lovet (2015):
 - Leverance: Der er udviklet et foreløbigt rådgivningskoncept, der kan implementeres og afprøves i en række testbesætninger
- Hvad har vi lavet:
 - Workshop; Intern
Udvikling af foreløbigt rådgivningskoncept: Viden og erfaringer om generel rådgivningspraksis er indsamlet og opgavens afgrænsning er vurderet.
- Hvad har vi ikke lavet:
 - Litteraturstudie af dansk og international litteratur.
 - Interviews af 5 landmænd, 5 dyrlæger og 5 rådgivere
 - Foreløbigt Rådgivningskoncept beskrevet
- Hvad skal laves i 2016 (leverancer)
 - Leverance: Der er udviklet et endeligt rådgivningskoncept, der præsenteres for styregruppen
 - Afprøves i 10 besætninger i 12 måneder
 - Løbende erfaringsopsamling, interviews, udviklingen i klovregistreringerne.
 - Justering af konceptet
 - Rapport præsenteres for styregruppen.

TIME – OG RESSOURCEFORBRUG

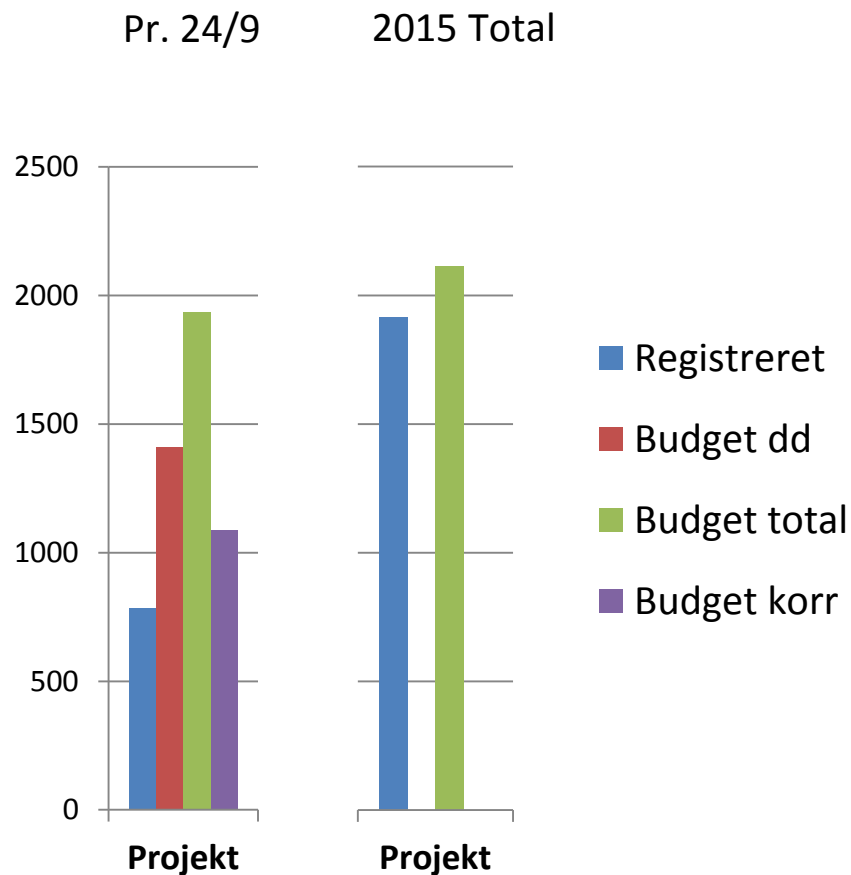

Ressource	Budget	Konstateret
Ekstern bistand	20000	22620
Nyanskaf.	2000	2283
Teknisk udstyr	52000	49370
Total	74000	74273

TIMER 2016

	Budget	AP 1	AP 2	AP 3
Inger	100			100
Niels	175		175	
Morten	25			25
Peter	265	250		15
Pia	675	270	49	356
Louise	15			
Jaap	55			
Anja	160			
Camilla	150			
Heidi	200	175		25
Nikolaj Hansen	?		?	

RESSOURCER

	Budget	AP 1	AP 2	AP 3
Ekstern bistand	118030	56280	29250	32500
Litteratur	4000			
Udstyr (kamera + montage)	33250		33250	
Mødelokale	25000			
Konferencer	19500			

PROJEKTPLAN

- ..\..\..\..\2016\01-Kvaeg\2275-Klovsundhed-udv\5-Projektstyring\Projektplan.Klov_UDV_aug2015.xlsx - Genvej.Ink

DRØFTELSE AF STATUS I FORHOLD TIL MÅL

- Tavlemøder – feed back
- Status, ressourcer, mål

